

**UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE LIGURI  
PROVINCIA DI SAVONA**

**RICOGNIZIONE OPERE ED INTERVENTI NECESSARI SULLE OPERE D'ARTE DELLA RETE STRADALE EX ANAS**

**PONTI**

Data rilev.to:	26 Novembre 2003	ex S.S. n.	490	Denominazione strada: DEL COLLE DI MELOGNO
Comune	Calizzano	Progressiva	Km. 17+790	
Denominazione corso d'acqua	Fiume Bormida di Millesimo	n. identificativo ponte:	SV490-P08	

<b>STRUTTURA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> cemento armato	<input type="checkbox"/> muratura	<input type="checkbox"/> altro	Note
<b>TIPOLOGIA</b>	<input type="checkbox"/> arco o volta	<input checked="" type="checkbox"/> travi prefabbricate	<input type="checkbox"/> altro	Note

<b>IMPALCATO (DATI)</b>	Corsie stradali	n. 2	Larghezza corsia	m. 3,80	Presenza banchine	Presenza marciapiedi
					<input checked="" type="checkbox"/> si 0,90+0,90    no <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> si 1,50+1,50    no <input type="checkbox"/>
	Dimensioni impalcato		Lunghezza	m. 615	Larghezza (m.)	12,60
	Numero campate	n. 22	Luce camp. Netta	m.27,90		

<b>IMPALCATO (MANUTENZIONE)</b>	Ferri scoperti <input type="checkbox"/> diffuso <input checked="" type="checkbox"/> localizzato	lesionature <input type="checkbox"/> presenti <input checked="" type="checkbox"/> assenti	Infiltrazioni e/o percolazioni <input checked="" type="checkbox"/> presenti <input type="checkbox"/> assenti
---------------------------------	--	--	---

*Osservazioni aggiuntive, valutazioni e costi presunti di intervento.*

Marciapiedi in cls a vista fortemente ammalorati. Infiltrazione si osservano in corrispondenza dei giunti di dilatazione in neoprene armato da mantenere ed in parte da sostituire

**Costo presunto d'intervento: € 450.000,00**

<b>SPALLE - PILE (DATI)</b>	Numero pile	n. 21	Tipo materiale	c.a.	Altezza indicativa max.	8,00 su alveo
-----------------------------	-------------	-------	----------------	------	-------------------------	---------------


<b>SPALLE - PILE (MANUTENZIONE)</b>	Ferri scoperti <input type="checkbox"/> diffuso <input type="checkbox"/> localizzato	Lesionature <input type="checkbox"/> presenti <input checked="" type="checkbox"/> assenti	Cedimenti al piede <input type="checkbox"/> presenti <input checked="" type="checkbox"/> assenti	Fenomeni erosivi <input type="checkbox"/> presenti <input checked="" type="checkbox"/> assenti
-------------------------------------	---	--	---	---

*Osservazioni aggiuntive, valutazioni e costi presunti di intervento*

**Costo presunto d'intervento: € .**

**UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE LIGURI  
PROVINCIA DI SAVONA**

EX STRADA STATALE N. 490	N. IDENTIF. PONTE SV490- P08
PROGRESSIVA KM.17+790	

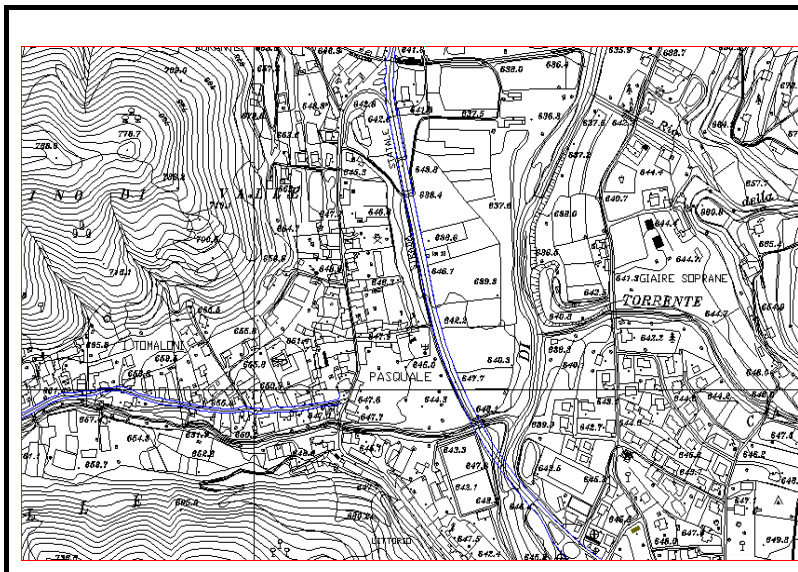

**STRALCIO C.T.R. 1:10.000**

Eventuali osservazioni conclusive



**FOTOGRAFIE**
