

**UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE LIGURI  
PROVINCIA DI SAVONA**

**RICOGNIZIONE OPERE ED INTERVENTI NECESSARI SULLE OPERE D'ARTE DELLA RETE STRADALE EX ANAS**

**PONTI**

Data rilev.to:	17 Settembre 2002	ex S.S. n.	28bis	Denominazione strada: DEL COLLE DI NAVA
Comune	Millesimo	Progressiva	Km. 19+200	
Denominazione corso d'acqua	BORMIDA DI MILLESIMO	n. identificativo ponte:	SV28bis-P02	

<b>STRUTTURA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> cemento armato	<input checked="" type="checkbox"/> muratura	<input type="checkbox"/> altro	note
<b>TIPOLOGIA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> arco o volta	<input type="checkbox"/> travi prefabbricate	<input checked="" type="checkbox"/> altro	note

<b>IMPALCATO (DATI)</b>	Corsie stradali	n. 2	Larghezza corsia	m. 3,35	Presenza banchine	Presenza marciapiedi
					<input checked="" type="checkbox"/> si 0,30+0,52    no <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> si 2,15+2,15    no <input type="checkbox"/>
	Dimensioni impalcato		Lunghezza	m.55,5	Larghezza (m.)	12,22
	Numero campate	n. 5	Luce camp. Netta	m.18,30		

<b>IMPALCATO (MANUTENZIONE)</b>	Ferri scoperti	<input checked="" type="checkbox"/> diffuso <input type="checkbox"/> localizzato	lesionature	<input checked="" type="checkbox"/> presenti <input type="checkbox"/> assenti	Infiltrazioni e/o percolazioni	<input checked="" type="checkbox"/> presenti <input type="checkbox"/> assenti
---------------------------------	----------------	---	-------------	--	--------------------------------	--

*Osservazioni aggiuntive, valutazioni e costi presunti di intervento.*

Il costo presunto di intervento riguarda l'intervento complessivo di risanamento delle strutture del ponte e consolidamento delle fondazioni delle pile e delle spalle.

**Costo presunto d'intervento: € 400.000,00**

<b>SPALLE - PILE (DATI)</b>	Numero pile	n. 4	Tipo materiale	c.a.	Altezza indicativa max.	5,00
-----------------------------	-------------	------	----------------	------	-------------------------	------

<b>SPALLE - PILE (MANUTENZIONE)</b>	Ferri scoperti	<input type="checkbox"/> diffuso <input checked="" type="checkbox"/> localizzato	Lesionature	<input type="checkbox"/> presenti <input checked="" type="checkbox"/> assenti	Cedimenti al piede	<input checked="" type="checkbox"/> presenti <input type="checkbox"/> assenti	Fenomeni erosivi	<input checked="" type="checkbox"/> presenti <input type="checkbox"/> assenti
-------------------------------------	----------------	---	-------------	--	--------------------	--	------------------	--


*Osservazioni aggiuntive, valutazioni e costi presunti di intervento*

Costo d'intervento ricompreso nella voce complessiva sopra indicata.

**Costo presunto d'intervento: € .**

**UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE LIGURI  
PROVINCIA DI SAVONA**

EX STRADA STATALE N. 28BIS PROGRESSIVA KM.19+200	N. IDENTIF. PONTE SV28bis- P02
---	-----------------------------------

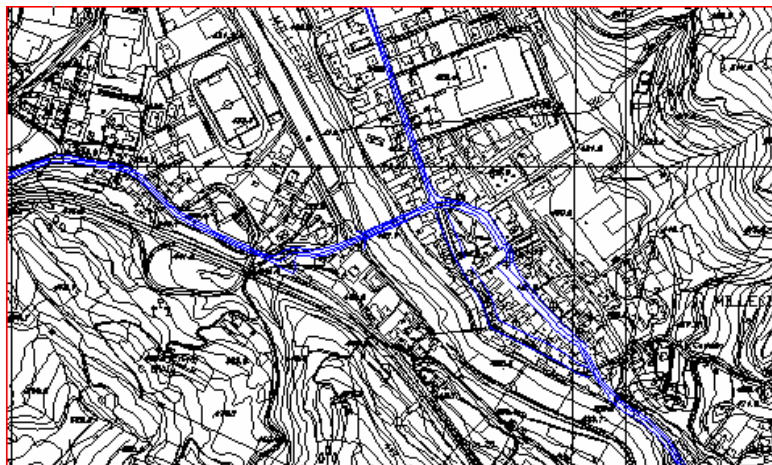

**STRALCIO C.T.R. 1:10.000**

Eventuali osservazioni conclusive



**FOTOGRAFIE**
