

**UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE LIGURI
PROVINCIA DI SAVONA**

RICOGNIZIONE OPERE ED INTERVENTI NECESSARI SULLE OPERE D'ARTE DELLA RETE STRADALE EX ANAS

PONTI

Data rilev.to:	28 Agosto 2003	ex S.S. n.	1	Denominazione strada:
Comune	Savona	Progressiva	Km. 572+000	AURELIA
Denominazione corso d'acqua		n. identificativo ponte:	SV1-P07	

STRUTTURA	<input checked="" type="checkbox"/> cemento armato	<input type="checkbox"/> muratura	<input type="checkbox"/> altro	note
TIPOLOGIA	<input type="checkbox"/> arco o volta	<input type="checkbox"/> travi prefabbricate	<input checked="" type="checkbox"/> altro	note

IMPALCATO (DATI)	Corsie stradali	n. 2	Larghezza corsia	m. 3,00	Presenza banchine	Presenza marciapiedi
					<input checked="" type="checkbox"/> si 0,20 +2,00 no <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> si 0,70+2,8 no <input type="checkbox"/>
	Dimensioni impalcato		Lunghezza	m.220,0	Larghezza (m.)	14,20
	Numero campate	n. 12	Luce camp. Netta	m.18,30		

IMPALCATO (MANUTENZIONE)	Ferri scoperti <input type="checkbox"/> diffuso <input checked="" type="checkbox"/> localizzato	lesionature <input type="checkbox"/> presenti <input checked="" type="checkbox"/> assenti	Infiltrazioni e/o percolazioni <input checked="" type="checkbox"/> presenti <input type="checkbox"/> assenti
-------------------------------------	--	--	---

Osservazioni aggiuntive, valutazioni e costi presunti di intervento.

I costi presunti di intervento riguardano l'intera struttura del viadotto e sono stati stimati da uno specifico studio di fattibilità degli interventi di risanamento necessari eseguito dalla Provincia di Savona.

Costo presunto d'intervento: € 1.900.000,00

SPALLE - PILE (DATI)	Numero pile	n. 11	Tipo materiale	c.a.	Altezza indicativa max.	3,00
---------------------------------	-------------	-------	----------------	------	-------------------------	------

SPALLE - PILE (MANUTENZIONE)	Ferri scoperti <input type="checkbox"/> diffuso <input checked="" type="checkbox"/> localizzato	Lesionature <input type="checkbox"/> presenti <input checked="" type="checkbox"/> assenti	Cedimenti al piede <input type="checkbox"/> presenti <input checked="" type="checkbox"/> assenti	Fenomeni erosivi <input type="checkbox"/> presenti <input checked="" type="checkbox"/> assenti
---	--	--	---	---

Osservazioni aggiuntive, valutazioni e costi presunti di intervento


I costi presunti di intervento relativi alle spalle ed alle pile sono compresi nel costo complessivo sopra indicato.

Costo presunto d'intervento: € .

**UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE LIGURI
PROVINCIA DI SAVONA**

EX STRADA STATALE N. 1
PROGRESSIVA KM.572+000

N. IDENTIF. PONTE SV1-P07

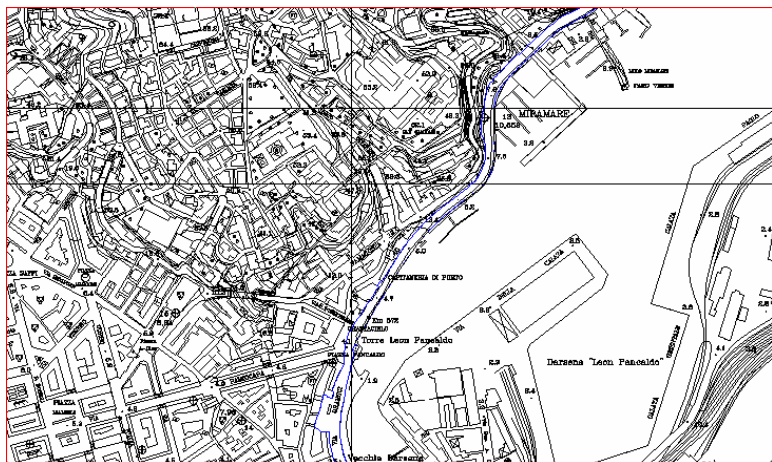

STRALCIO C.T.R. 1:10.000

Eventuali osservazioni conclusive



FOTOGRAFIE
