



## RICOGNIZIONE OPERE ED INTERVENTI NECESSARI SULLE OPERE D'ARTE DELLA RETE STRADALE EX ANAS

**GALLERIE**

Data rilevamento:	<b>30 Ottobre 2002</b>	Progressiva inizio:	<b>8,007 Km</b>
Ex S.S. n°:	<b>331</b>	Progressiva fine:	<b>8,315 Km</b>
Denominazione strada:	<b>"di Lerici"</b>	Denominazione galleria:	<b>"Pugliola"</b>
Comune:	<b>Lerici</b>	Lunghezza:	<b>308 m</b>

<b>MATERIALE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> cemento armato	<input type="checkbox"/> muratura	<input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/> note
<b>TIPOLOGIA STRUTTURALE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> arco o volta	<input type="checkbox"/> travi prefabbricate	<input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/> note

<b>ILLUMINAZIONE</b>	file longitudinali n°:	<b>2</b>		
	collocazione:	<input type="checkbox"/> centrale in asse	<input checked="" type="checkbox"/> laterale	
	colore luci:	<b>giallo</b>		
	stato di manutenzione	<input type="checkbox"/> buono	<input checked="" type="checkbox"/> medio	<input type="checkbox"/> cattivo
	interventi previsti e costi presunti:	<b>Sostituzione di 13 lampade</b>		<b>2.500,00 €</b>

<b>SEGNALETICA</b>	luminosa generica:	<input type="checkbox"/> presente	<input checked="" type="checkbox"/> assente	
	emergenza:	<input type="checkbox"/> colonnine SOS	<input type="checkbox"/> estintori	<input type="checkbox"/> piazzole sosta
	altro:	<b>segnale "galleria" (art. 135 fig. 316)</b>		
	stato di manutenzione	<input type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> medio	<input type="checkbox"/> cattivo
	interventi previsti e costi presunti:	<b>Fornitura e posa in opera di delineatori stradali come da Fig. Il 464 Art. 174 (per galleria)</b>		<b>1400,00 €</b>

<b>VENTILAZIONE</b>	<input type="checkbox"/> presente	<input checked="" type="checkbox"/> assente		
	stato di manutenzione	<input type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> medio	<input type="checkbox"/> cattivo
	interventi previsti e costi presunti:			

<b>RIVESTIMENTO</b>	<input type="checkbox"/> pannelli	<input checked="" type="checkbox"/> vernice	<input type="checkbox"/> altro	
	stato di manutenzione	<input type="checkbox"/> buono	<input checked="" type="checkbox"/> medio	<input type="checkbox"/> cattivo
	interventi previsti e costi presunti:	<b>Risanamento pareti e rivestimento con pannelli in alluminio, pulizia e impermeabilizzazione canaletta per raccolta acque di scolo, pulizia marciapiede e bordo strada</b>		<b>267.000,00 €</b>


<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>	<b>270.900,00 €</b>
--------------------------------	---------------------

UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE LIGURI  
PROVINCIA DELLA SPEZIA

identificativo galleria

**G02-SP**

Ex S.S. n°:	<b>331</b>
Denominazione strada:	<b>"di Lerici"</b>
Progressiva inizio:	<b>8,007 Km</b>
Denominazione galleria:	<b>"Pugliola"</b>

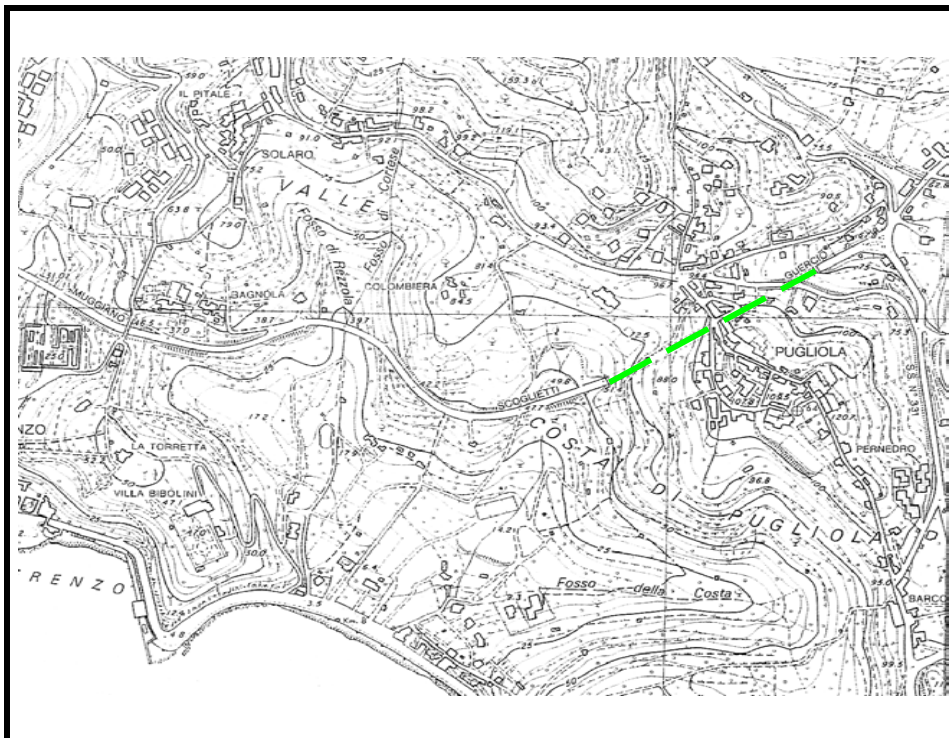

STRALCIO C.T.R. 1:10.000



FOTOGRAFIE

Eventuali osservazioni conclusive
